

بيان بموقف المشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى ٢٠١٩/٧/٢٠ م سوهاج

الملاحظات والاجراءات المتخذة	جاري الطرح والترسية	موقف التنفيذ		الجهة المستفيدة	الجهة المنفذة	تكلفة المشروع (التقديرية جنية)	عدد المشروعات	اسم المشروع	م
		جاري التنفيذ	نسبة الاجاز الفعلي %						
	تم الانتهاء	٤٤.٤٠١.٩٣٨	%١٠٠	اهلى المناطق المحرومة	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	١٨.٧٠٩.٤٦٥	١١	مشروعات توصيل المياه للمناطق المحرومة على مستوى المحافظة	١
	جاري التنفيذ		%٩٨	خدمة اهلى الكوثر والحويثي والمناطق الصناعية بغرب جرجا	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٣١,٦١٢,٦٢٥	٣	مشروعات خطوط طرد مياه شرب الجوزات والحويثي وتطوير محطات مياه سعد السعود	٢
تم صرف نسبة مقدم العقد بنسبة ٢٥ % لعدد ٩ مشروعات وجرى تنفيذ عدد ٩ مشروعات	تم الترسية لعدد ٩ مشروعات وجاري الترسية لعدد ٢	١١٨.٨٢٢.٤٣١	%٩	مراكز المحافظة (المراغة وسوهاج)	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	٧١٤,٨٧١,٢٨١.٠	١١	الاجمالي الصفي	٣
جرى التنسيق مع هيئة الانتاج الحرى لاستكمال اعمال التركيبات بالمحز الاى بحى الكوثر	تم النهو	١,١٦٥,٩٦٦	%١٠٠	مديرية الطب البيطري	مديرية الاسكان	١,٠٦٥,٩٦٦,٢٠	١	خدمات بيطرية	٤
	جاري التنفيذ	٨.٣٣٠.٢٢٢	%٦٠	منطقة آثار سوهاج	مديرية الاسكان	١٤,٧٢٧,٩٠٥.٢٨	٢	تطوير مناطق اثرية	٥
	جاري التنفيذ	٢.٦٠٣.٢٤٥	%٩٥	مديرية الطب	مديرية الاسكان	٣٧.٠٠٠.٠٠٠	١	خدمات طبية تطوير مستشفى حميات بنى حميل- البليتا- سوهاج	٦
تم نهو عدد ٦ مشروعات		٨٦,٥٨١,٥٩٠	%١٠٠	الوحدات المحلية	مديرية الفرق	٨٦,٥٠٦,٥٠٠.٠٠٠	٦	مشروعات الطرق	٧
تم الانتهاء من عدد ٢ مشروع وجرى العمل بعدد ٢ مشروع وتم طرح استكمال ترعة المساعيد ٩٠ متر طولى	تم الانتهاء من طرح استكمال ترعة المساعيد ٩٠ متر طولى	٤١,٤١٨,٧٦٥	%١٠٠	الوحدات المحلية التي تمر بها التنمية	مديرية الري	٥٠,٩٤٨,٥١٢.٠٠٠	٤	مشروعات الري	٨
تم تنفيذ بعض الاجراءات من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى وهى كالتالى : تدريب العاملين على الحاسب الاى تجهيز الشبكات وخطوط ربط توفير اجهزة الكترونية	تم تنفيذ بعض الاجراءات من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى وهى كالتالى : تدريب العاملين على الحاسب الاى تجهيز الشبكات وخطوط ربط توفير اجهزة الكترونية	١.٧٤٤.٦١٥	تم تنفيذ انشاءات بقيمة ١.٧٤٤.٦١٥	سكان محافظة سوهاج	وزارة التخطيط	٢٨.٠٠٠.٠٠٠	١٥	تطوير الخدمات الحكومية (تطوير المراكز التكنولوجية)	٩
تم توقيع بروتكول مع هيئة التنمية الصناعية وتم دفع مبلغ ١٢٥ مليون جنية كدفعة مقدمة بنسبة ٢٥ % من قيمة المشروعات	تم توقيع بروتكول مع هيئة التنمية الصناعية وتم دفع مبلغ ١٢٥ مليون جنية كدفعة مقدمة بنسبة ٢٥ % من قيمة المشروعات	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	%٢٥ مقدم	المستثمرين	تنفيذ هيئة التنمية الصناعية	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧	ترفيق مناطق صناعية (الاحادية - الكوثر - غرب ططا - غرب جرجا)	١٠

السكرتير العام م

وكيل اول الوزارة

يسري عبد الغنى فاضل



مدير وحدة التنفيذ

عبد العزيز عيسى


أ.د / عمر محمد الحادي

اخصائي المتابعة والتقييم

السيد عبدالواحد محمد

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٧-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة الصف (جني)	تاريخ سداد الموقع	تاريخ البدء في العمل	تاريخ انتهاء	مدة التنفيذ	نسبة الاجاز القطعي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات والجراءات	مقاول العمية
١	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة المعازلة	٢٩٠٠٠	٣,٢٠٩,٤٦٥	٢٠١٨/٠٦/٢٠	٣٢٢٠١٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/٧/٢٠	٥ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٥-٢٢ الجمعية التعاونية للاشياء والتصنيع بجبهينه
٢	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز طما	٣٠٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١١	١٢٠٥٥٥	٢٠١٨/٠٧/١٢	٢٠١٨/٠٧/١٢	٢٠١٨/٧/٢٧	٤ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-١٥ الجمعية التعاونية للاشياء والتصنيع بسوهاج
٣	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز طهطا	٣٢٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	١٠٦٧٥٥	٢٠١٨/٠٧/١٧	٢٠١٨/٠٧/١٧	٢٠١٨/٧/٢٧	٤ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٥ محمد حموده على
٤	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز المراغة	٢٨٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٤	١١٧٨٧١٥	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/٧/٢٠	٤ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٠ الجمعية التعاونية للاشياء والتصنيع بسوهاج
٥	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز جبهينه	٢٢٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٦	١١٤٦٥٠٠	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٢٠١٨/٧/٢٢	٤ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٥ احمد عبده مصلى
٦	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز سوهاج	٣٥٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠٤٩٦٥	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٨/٧/٢٨	٥ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٥ "الجميه محمد قبيصى"
٧	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز اخميم	٣٠٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	١٧٨٧١٥	٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٧/١٦	٤ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٧ "جميه لبروط"
٨	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز المنشاه	٢٣٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	٩٣٥٨٧	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٢٠١٨/٠٧/٢٢	٢٠١٨/٧/٢٢	٤ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-١٦ على عبدالرحيم محمد
٩	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز سالقته	٢٠٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	١٤٨٨١٢	٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٠٧/١٦	٢٠١٨/٧/١٦	٤ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٥ "ابراهيم محمد قبيصى"
١٠	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز جرجا	٣١٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٤	١٧٤٤٩٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/٧/٢٠	٥ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٨ محمد الزمرى
١١	توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة مركز دارالسلام	٢٠٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/١١	١٢٥٤٧٠	٢٠١٨/٠٧/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٥	٢٠١٨/٧/١٥	٤ أشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-٦-٢٠ "مكتب العز للتقاروت"
١٢	تنفيذ خط طر مياه من محطة مياه الجوازات بطول ١.٥ كم الى الحويتى	١٣١٠٠٠	٣,٢٤٨,٥٠٠	٢٠١٨/١١/٠٦	٤٨٣٢٠٠	٢٠١٨/٧/١١	٢٠١٨/٧/١١	٢٠١٨/٧/١١	٥ أشهر	%٩٩	%١٠٣	جارى	لا يوجد	تم بتاريخ ٢٠١٨-١٠-٣ "محمدي سمير بهان"



السكرتير العام
اللواء / يسرى عبد المنعم خضمر

مدير وحدة التنفيذ
عبد الوهيد
دا عمر محمد الحادى

احمد عبدالهادى
الدرسيه
الاصنافى المتابعة
الاصنافى البنية التحتية
عبد الوهيد
م/ عبير الطيب

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٧-٢٠١٩ م

مقاول العملية	المواقف والاجراءات	موقف التنفيذ	نسبة ما تم صرفه %	نسبة الاجاز القطعي %	مدة التنفيذ	تاريخ نهو	تاريخ البدء في العمل	تاريخ سداد المبلغ	قيمة الصفح (جنيه)	تاريخ التعاقد	تكلفة المشروع التقديرية (جنيه)	عدد المستفيدين	اسم المشروع	م
تم بتاريخ ٢٠١٨-٧-١٨ "حمدي سمير بهادر"		جاري	97%	99%	٦ اشهر	٢٠١٩/٠٩/٠٩	٢٠١٨/٠٩/٠٩	٢٠١٨/٠٩/٠٩	٧٣٣٧٨٠	٢٠١٨/٠٩/٠٤	٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠	تنفيذ خط طرد مياه قطر ١٦ بوصة لمحطتى مياه الحواويش ٣، ٤،	١٣
تم بتاريخ ٢٠١٨-٨-٢٦ "صلاح حسن عمر"		انتهى	100%	100%	٢.٥ اشهر	٢٠١٨/١٢/٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٤٣٥٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٢		١٦٠٠٠	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/١ ابار)	١٤
تم بتاريخ ٢٠١٨-٨-٢٦ "محمد الزينى"		انتهى	100%	100%	٢ اشهر	٢٠١٨/١٢/٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٣٥٨٧٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٥		بالإضافة الى المنطقة الصناعية بجرجا	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٢ خط طرد)	١٥
تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٢٦ "المكتب الهندسي للتصميم والتنفيذ"		جاري	97%	97%	٥ اشهر	٢٠١٩/٠٣/٠٤	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٠١٨/٠٩/٠٥	١٣٣٠٥٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠١	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠٠٠	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٣ اعصال كهربوميكاكيا)	١٦
تم بتاريخ ٢٠١٨-٩-٢٦ "مكتب الزينى للمقاولات"		جاري	97%	98%	٥ اشهر	٢٠١٩/٠٣/٠٥	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٠١٨/٠٩/٠٥	٢٥٣٢٥٧٠٥	٢٠١٨/٠٩/٢٣		١٦٠٠٠	تنفيذ محطة مياه سعد السعود (عقد ٤/٤ اعصال مبنية)	١٧
المكتب الاستشاري انظر كمنسلتو هشام عبدالحميد		جاري	18%	٠	٢٢ شهر + يوم	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٨٠٧٥٧٠٠	٢٠١٨/٠٧/٢٥	٦,٨٧١,٢٨١		اعمال الدراسات التصميمية والاستشارية واعداد مستندات الطرح والاشراف على التنفيذ لعدد ٨ قرى	***
مكتب التقوي للمقاولات (محمود رابع ثابت)			0%	17%	١٠	٢٢/٢/٢٠١٩	٢٣/٤/٢٠١٩	٢٣/٤/٢٠١٩	٦,١٣٥,٣٦٠	١٧/٠٤/٢٠١٩	٣٠٧٦		إستكمال و تاهيل محطات الرفع و خطوط الطرد أو لاول غربى - الكه اطار	١
مكتب التقوي للمقاولات (محمود رابع ثابت)			0%	27%	٦	٦/١٠/٢٠١٩	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٦,٢٩٠,٧٨٨	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-١			إستكمال و تاهيل شبكات الاحداد	
مكتب التقوي للمقاولات (محمود رابع ثابت)			0%	17%	١٠	٢٢/٢/٢٠١٩	٢٣/٤/٢٠١٩	٢٣/٤/٢٠١٩	٦,٤٥٣,٣٠٠	١٧/٠٤/٢٠١٩	٢,٣٩٨	١٥٨١٣٧	إستكمال و تاهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرية الهجارسة	٢
مكتب التقوي للمقاولات (محمود رابع ثابت)			0%	27%	٦	٦/١٠/٢٠١٩	٢٠١٩-٤-٧	٢٠١٩-٤-٧	٣,٠٣٣,٥٤١	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-١			إستكمال و تاهيل شبكات الاحداد لقرية الهجارسة	
الجمعية التعاونية للاشياء والتصنيع سوهاج			0%	0%					٢٦,٤٨٣,٣٠٨	جارى اصدار خطاب القبول			تطوير و تاهيل مزرعة معالجة الهجارسة	



السيد تيز العام
الواء / يسرى عبد المنعم خضرم

مدير وحدة التنفيذ
عم محمد محمد

احمد عبد الهادى
مدير الطب
م/ عيسى الطيب

احصائي المتابعة
احصائي البنية التحتية

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٧-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التعاقد	تاريخ البدء في العمل	تاريخ انتهاء المشروع	مدة التنفيذ	نسبة الاجازة القضي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	المواعيد والاجراءات	مقاول الصيانة
٣	مشروع معالجة الهجارسمة	٢٩٢١٥	٢٠١٩-٥-١	٢٠١٩-٦-١٨	٢٠١٩-٤-١٧	١٠	%٦	%٠	تسويات		
	معالجة الهجارسمة و تنفيذ خط السبب النهائي لمصرف غرب سوهاج		٢٠١٩-٥-٢٢	٢٠١٩-٥-٢٨	٢٠١٩-٥-٢٧	١٢	%٠	%٠	تسويات		
	استكمال و تاهيل محطات الرفع و خطوط الطرد لقرى عرابية ابو الذهب تنفيذ شبكات الصرف الصحي (جزء اول) لقرية عرابية ابو الذهب		٢٠١٩-٥-٢٢	٢٠١٩-٣-١٤	٢٠١٩-٣-١٣	٢٠٢٠-٦-١٣	١٥	%١٥	%٢٥	تسويات	
٤	استكمال اعمال الصرف الصحي لمرابية ابو ذهب	٢٩٢١٥	جاري البيت المالي				%٠	%٠	تسويات		الشركة العامة للاتصالات (رولان)
	الاعمال المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية عرابية ابو ذهب		٢٠١٩-٣-١٣	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢٠	١٥	%١١	%٢٥	تسويات		الشركة العامة للاتصالات (رولان)
٥	استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية القراقرة والقيصان	٥,٧٧٩	٢٠١٩-٥-١٤	٢٠١٩-٥-١٩	٢٠١٩-٥-١٨	١٢	%٠	%٠	لم يبدء بعد		الجمعية التعاونية للاتشاء والتصوير باسيوط
	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لتجمي القراقرة والقيصان وابوحسين (حل دائم)		٢٠١٩-٣-١٤	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢٠	١٢	%٢٧	%٣٠	جاري التنفيذ		الجمعية التعاونية للاتشاء والتصوير بجهينة
	استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية القراقرة والقيصان		٢٠١٨-٩-٥	٢٠١٨-٩-٦	٢٠١٨-٩-٦	١٠	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		الجمعية التعاونية للاتشاء والتصوير بجهينة



السكزاتير العام
د/ عمرو محمد الحادى

مدير وحدة التنفيذ
عماد الدين عيسى

احصاني المتابعة
احمد عبد الهادى

احصاني البنية التحتية
م/ عيسى الطيب


اللواء / يسرى عبد المنعم خضمر

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٧-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التعاقد	قيمة الصفح (جنيه)	تاريخ سداد موعود	تاريخ البدء في العمل	تاريخ التمهيد	مدة التنفيذ	نسبة الاجاز القطعي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	المواقف والاجراءات	معاول العمليه
٦	استكمال مشروع الصرف الصحي لقرية القراقرة والقيصان (تنفيذ اعمال)			تم بتاريخ ٢٠١٨-١١-٧	٢,٦٩٨,٠٠٠	تم بتاريخ ٢٠١٨-١١-١١	تم بتاريخ ٢٠١٨-١١-١١	٢٠١٩-٢-١١	٣ اشهر	%١٠٠	%١٠٠			الجمعية التعاونية للاشياء والتصوير بجبهية
	مشروع الصرف الصحي لقرية الوقده	٣٩٦٥٧	١٩,٨٤٥	تم بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩	٩,٥٢٩,٨٢٢	٢٠١٩-٤-٤٤	٢٠١٩-٤-٤٤	٣/٤/٢٠٢٠	١٢	%٤	%٢٥		شركة النصر العامه للمقاولات (حسن محمد علام)	
٧	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الوقده	٩٥٦٦		تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-٧	٤١,٦٧٤,١٥٠	٢٠١٩-٣-١٢	٢٠١٩-٣-١٢	٢٠١٩-٣-١١	١٢	%١١	%٢٥	تشويكات		الشركة العامه للاشياء (رولان)
	مشروع الصرف الصحي لقرية عرابية ابو عزيز	٢٩٣١٥	٢٤,٥٢٧	تم اصدار اخطار الترسية ٢٠١٩-٣-٦	٦,٢٧٧,٩٣١				١٢	%٠	%٠			الشركة العامه للاشياء (رولان)
٨	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية عرابية ابو عزيز			تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-٦	٦٢,٩٢٨,٤٤٠	٢٠١٩-٣-١٠	٢٠١٩-٣-١٠	٩/٦/٢٠٢٠	١٥	%١٨	%٢٥		شركة النصر العامه للمقاولات (حسن محمد علام)	
	مشروع الصرف الصحي لقرية البطاخ	٣٩٦٥٧		تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-١	٧,٦٣٣,٠٩٢	٢٠١٩-٤-٤٤	٢٠١٩-٤-٤٤	٢٠٢٠-٤-٣	١٢	%١٢	%٢٥		شركة النصر العامه للمقاولات (حسن محمد علام)	
٩	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات	٩٨٤٧	٢٥,٦٤٣	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-١٣	٥٣,٨٦٧,٨٥٥	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠١٩-٣-٢١	٢٠٢٠-٧-٢٠	١٢	%١٢	%٢٥		شركة النصر العامه للمقاولات (حسن محمد علام)	
	مشروع الصرف الصحي لقرية الغريزات	٣٩٦٥٧	٥٢,٥٨٥	تم بتاريخ ٢٠١٩-٤-١	١١,٩٩٩,٣٨٥	٢٠١٩-٤-٤٤	٢٠١٩-٤-٤٤	٢٠٢٠-٤-٣	١٢	%٤	%٢٥		شركة النصر العامه للمقاولات (حسن محمد علام)	
	تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الغريزات	٢٠٢٤٤		تم اصدار خطاب القبول	٩٤,٨٥٨,٧٧٤				١٥	%٥	%٠		الجمعية التعاونية للاشياء والتصوير اسويط	

احصائي البنية التحتية
احصائي المتابعة
احمد عبدالهادي

مدير وحدة التنفيذ
عمر حجازي
د/ عمر محمد الحادي



مدير العام
عبدالمعز

اللواء / يسرى عبد المعز خضرم

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٧-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التعاقد	تكاليف المشروع التقديرية (جنية)	قيمة الصفح (جني)	تاريخ سداد صرف	تاريخ بدء العمل	تاريخ انتهاء	مدة التنفيذ	نسبة الاجاز القطعي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	المواقف والاجراءات	مقاول التنفيذ
١٠	الاصحاح المطلوبة لمعالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات	٣٩٦٥٧	تم بتاريخ ٢٠١٩-٣-٢٨	٦٥.٩٤٤	٨٣.٩٧٨.٤٣٣	٢٠١٩-٤-١	٢٠١٩-٤-١	٢٠١٩-٦-٣٠	١٥	%١٥	%٢٥			شركة المثلات والصناعات التخصصية (عثمان جروب)
١	استكمال المركز الطبي البيطرى باخميم-سوهاج		٢٠١٨/٠٥/٠٨	١١٦٥٩٦٦.٢	١١٦٥٩٦٦	٢٠١٨/٧/١٨	٢٠١٨/١/٠١	٢٠١٨/١/٠٧	٦ اشهر	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		جمعية الانشاء والتعمير بابو نجى طلعت عبدالمصدي احمد
٢	انشاء وتطوير منطقة اثار مقابر الحواويش- اخميم-سوهاج		٢٠١٨/٠٤/١٨	١٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٦٠.٨٢٦٢	٢٠١٨-١١-١٠	٢٠١٨/١/٠٩	٢٠١٩/١/١١	١٢ شهور	%٩٥	%٨٧	جارى		جمعية الانشاء والتعمير بابو نجى طلعت عبدالمصدي احمد
٣	انشاء وتطوير منطقة اثار معبد الازيس-نجع الشيوخ-حدسوهاج		٢٠١٨/٠٩/٢٧	٤٢٧٩.٥.٢٨	٤٧٢٧٩.٥٥	٢٠١٨-١١-١٠	٢٠١٨/١/٠٩	٢٠١٩/١/١٠	١٢ شهر	%٤٥	%٤٤	جارى		جمعية الانشاء والتعمير بجيمنة
٤	علاج وتطوير مستشفى حميات بنى حميل- البليتا- سوهاج		٢٠١٨/٠١/٢٤	٣.٧٠٠.٠٠٠	٣.١٢١٨٧٧	٢٠١٩/٠١/٠٢	٢٠١٩/٠١/٠٢	٢٠١٩/١/٠١	١٣ شهر	%٩٥	%٧٨	جارى العمل		شريف علي محمد يونس
١	رصف الطريق من العوامر - بيت داوود - المنظة الصناعية - غرب جرجا	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٥	٢٤٤٦٤٥.٠٠	٢٨٧٤٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٣١	١٧٩ يوم	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		محمود علي احمد
٢	رصف الطريق من الشيخ حمد - الازيس - طريق المطار بمرکز سوهاج	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	١٤.٥٧٢.٥٠٠	١١٦٥٨٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٨/٠٧/٠٨	٢٠١٩/٠١/٠٤	١٧٩ يوم	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمقاولات وانشاء الطرق بامسوط
٣	اعادة رصف وتوسيع طريق الاحايوة شرق - مشروعات المحافظة - المنظة الصناعية بالاحايوة شرق	٥٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	١٢٣٣٢.٠٠٠	٧٩٢٣٥٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٣١	١٧٩ يوم	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		المكتب الحديث للمقاولات وانشاء الطرق بامسوط
٤	اعادة رصف طريق المنظة الصناعية بغرب طهطا-الصفحة	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	٨.٥٥٥.٥٠٠	٦٨٦٨٠٠٠	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/٠٧/٠٢	٢٠١٨/١٢/٠٢	خمس شهور	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		مكتب ابو ديب للمقاولات
٥	رصف طريق مقاري الشيخ عمار - الشيخ عمار - مشطا بمرکز بطما	١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٥٩٤٩٥.٠٠	٦٦١٤٣٧٥	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/٠٦/٢٤	٢٠١٨/١/٢٤	خمس شهور	%١٠٠	%١٠٠	انتهى		صاد الدين كامل عبداللطيف



النواء / يسرى عبد المنعم خضر
مدير وحدة التنفيذ
د/ عمر محمد الحادى

احصاني البنية التحتية
احصاني المتابعة
احمد عبدالهادى
م/ عبير الطيب

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٧-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تاريخ التعاقد	تاريخ البدء في العمل	تاريخ انتهاء العمل	تاريخ التمهيد	مدة التنفيذ	نسبة الاجازة القضي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	الملاحظات والجراءات	مقاول العملية
٦	رصف وتوسعة طريق مدخل طما الشمالي طريق طما - طهطا بين الترعين	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٢٦	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٨/٠٧/٠٥	٢٠١٩/٠١/٠٢	١٧٩ يوم	%١٠٠	%١٠٠	انتهي		المكتب الحديث للمقاولات والشاء الطرق بلسويط
١	تنظية ترعة اولاد نصير امام المدرسة الاعدادية بطول ٢١٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٧/١٢	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٩/٠٣/٠٩	٨ شهور	%١٠٠	%١٠٠	انتهي		
٢	تنظية ترعة المساعيد بنج زقالي - جرجا بطول ١١٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٧/١٥	٢٠١٨/٠٧/١٠	٢٠١٨/١٢/٠٩	٣ شهور	%١٠٠	%١٠٠	انتهي		
٣	استكمال تنظية ترعة المساعيد بنج زقالي - جرجا بطول ٩٠							%	%			تم طرح المقايمة بتاريخ ٢/٢٠١٩
٤	تنظية عزبة الحيط الجديدة	٤١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٧/٠٩	٢٠١٨/٠٧/٠٩	٢٠١٩/٠٧/٠٩	١٢ شهر	%٩٥	%٧٢	جاري		
٥	تنظية التربة الرئيسية وتوسعة مدخل طهطا الشمالي عند منزل كوبري طهطا الجديد	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٨/٠٩/٠٤	٢٠١٨/١١/٢٤	٢٠١٨/١١/٢٥	٢٠١٩/٠٧/٢٤	٨ شهور	%١٠٠	%٩٨	جاري		
١	استكمال شبعة الصرف الصحي وربط المرحلة الاولى والثانية بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا	٢.٥ مليون						%	%			
٢	توريد وتركيب ١٠ كشك كهرباء ٥٠٠ مك.ف.١. بكابلات تغذية بالإضافة الى اعدة الالارة بالمنطقة الصناعية	٧.٥٠٠ مليون						%	%			
٣	توريد وتركيب ٢٠ كشك كهرباء ٥٠٠ مك.ف.١. بالكابلات لتغذية بالإضافة الى اعدة الالارة المنطقه الصناعية الاحايوة	٢.٠ مليون						%	%			جاري التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية
٤	بدء انشاء طريق دائري بطول ٦ كم وعرض ٣٠ وانتهاء من المرحلة الاولى والثانية المنطقه الصناعية بغرب جرجا	٥٠٠ مليون						%	%			
٥	شبكة الصرف الصحي بالمرحلة الاولى (٢٣٠ قدان) بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا	١٥ مليون						%	%			
٦	تطوير مجمع الالارات بغرب طهطا (٧٠ قدان)	١٩٠ مليون						%	%			

احصائي البنية التحتية
احصائي المتابعة
احمد عبدالهادي
م/ عبير الطيب

مدبر وحدة التنفيذ
عمر الزين
د/ عمر محمد الحادي




الواء / يسرى عبدالمنعم خضمر
المكتب تيز العام

الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة سوهاج حتي تاريخ ٣٠-٧-٢٠١٩ م

م	اسم المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع التقديرية (جنية)	تاريخ التناقد	قيمة العقد (جنية)	تاريخ استلام الموقع	تاريخ البدء في العمل	تاريخ التمهيد	مدة التنفيذ	نسبة الاجازة الفعلي %	نسبة ما تم صرفه %	موقف التنفيذ	المواعيد والاجراءات	مقار المعنية
٧	إحلال وتجديد شبكة التغذية بالمياه بالإضافة الى تطوير محطة ٦٠٠ م بالمنطقة الصناعية بالاخاوية شرق		٣٨ مليون							%٠	%٠	تم التنفيذ		
١	تطوير المراكز التكنولوجية البووان العام (انشائي)		١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٦/٢٧	١٤٣٩٣٨	٢٠١٩/٠٦/٢٨	٢٠١٩/٠٦/٢٨	٢٠١٩/٠٦/٢٧	٤ اشهر	%١٠	%٤	تم التنفيذ		محمد حامد عبدالرحيم
٢	تطوير المراكز التكنولوجية بطما (انشائي)		١٧٤,١٢٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٧٤١٢٠	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٢٠١٩/٠٤/٠٩	٢٠١٩/٠٦/٠٨	شهرين	%١٠٠	%٨٠	تم التنفيذ		هاني محمود محمد عارف
٣	تطوير المراكز التكنولوجية بطهطا (انشائي)		٨٢٧٩٢٧	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٨٢٧٩٢٧	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٧/٠٧	ثلاثة اشهر	%١٠٠	%٧٥	تم التنفيذ		اشرف محمد محمد ابورقم
٤	تطوير المراكز التكنولوجية سوهاج (انشائي)		٢٤٤,٤٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٤٤٤٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%٩٠	تم التنفيذ		محمد حامد عبدالرحيم
٥	تطوير المراكز التكنولوجية المنشأة (انشائي)		٦٣١٥٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٣٦١٥٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٢٠١٩/٠٤/١٠	٢٠١٩/٠٦/٠٩	شهرين	%١٠٠	%٩٦	تم التنفيذ		طلعت عبدالحميد حامد
٦	تطوير المراكز التكنولوجية البينا (انشائي)		٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/١٤	٥٧٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠١٩/٠٤/١٤	٢٠١٩/٠٦/١٣	شهرين	%١٠٠	%٧٥	تم التنفيذ		محمد احمد عبدالطيف الخولي
٧	تطوير المراكز التكنولوجية حي شرق (انشائي)		١٣٢٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٣٢٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%٩٢	تم التنفيذ		عبد رزق محمدي
٧	تطوير المراكز التكنولوجية حي غرب (انشائي)		١٣٢٦٥٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	١٠٠٠٠٠	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٤/٠٨	٢٠١٩/٠٦/٠٧	شهرين	%١٠٠	%١٠٠	تم التنفيذ		الوحدة المحلية

مدير وحدة التنفيذ
عمر محمد الحادي

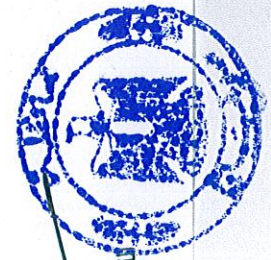

السكندر العام
اللواء / يسرى عبد المنعم كحضر

احصائي البنية التحتية
احمد عبدالهادي
